

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

برای شبانه قدر معین از آسمان نازل کرده و آن را در زمین ننگه داشته‌یم در حالی که بلا و ساختن آن زیر قادر یم

سوره مبارکه مومنون، آیه ۱۸



گزارشی از عملکرد پروژه‌های
شهری
شرکت آب و فاضلاب استان
لرستان
در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر خرم‌آباد

۱

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر کوه‌دشت

۲

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر الشتر

۳

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر نورآباد

۴

Slide 3

MP2D1

MRT Pack 24 DVDs 1390/02/17 :

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر پلدختر

۱

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر دورود

۲

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر ازنا

۳

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر الیگودرز

۴

ایجاد تاسیسات آب شهر خرم آباد

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب شهر خرم آباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	طراحان نصر کوثر	۱۷/۶۸۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۶۵	۱,۱۶۰۲	۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۰۰۳,۳۳۳	موقت ۴	۱,۷۹۶,۱۳۱,۴۰۹	۱۲۵	۶۷
۲	آب	خرم آباد	خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۷۸۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۲۰	۱,۲۲۱	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵,۵۷۶,۰۵۷	موقت ۲	-	۶۹	۹۶
۳	آب	خرم آباد	خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۹۴۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۹۰	۱,۱۵۷۳	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۵۴۷,۵۰۰	موقت ۳	-	۱۲۵	۱۱۲
۴	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۱۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۲۰	۱,۲۰۹۷	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۱۶۰,۴۳۴	موقت ۳	-	۱۲۵	۱۲۳
۵	آب	خرم آباد	ساخت و تجهیز اتاقک چاهها	کسری سازه زاگرس	۱۷/۷۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۲۰	۱,۴۵۲۸	۲۶,۳۵۵,۷۴۳,۹۴۱	۸,۷۱۹,۶۱۲,۹۸۶	موقت ۳	-	۸۰	۳۳
۶	آب	خرم آباد	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	اژنگ راه چمشک	۱۷/۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۰۰	۱,۷۹۱	۲۵۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۲,۷۵۲,۲۷۷	موقت ۳	-	۲۴	۵۵
۷	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آرمان سازان آستیاک	۱۷/۳۷۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰	۱,۰۷۱	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۵۴,۴۴۷	موقت ۳	۱,۸۰۵,۴۴۳,۴۳۸	۱۲۵	۹۷
۸	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۵۸۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۶۵	۱,۱	۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۰,۱۱۵,۸۹۶	-	-	۹۲	۶۸
۹	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۵۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۰	۱,۲۵	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۲۳۵,۴۳۷	موقت ۱	-	۷۵	۷۹
۱۰	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	اوژن سازه سپهر	۱۷/۶۹۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۶۵	۱,۰۳	۳۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۰۴۳,۲۷۵	موقت ۲	۱,۱۷۶,۷۰۲,۰۴۷	۱۵	۲۰
۱۱	آب	خرم آباد	حصار کشی تاسیسات آب استان	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۹۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۰	۱,۵۰۴۳	۱۷,۱۶۳,۶۷۶,۹۸۲	۵,۷۱۸,۴۲۵,۸۵۴	موقت ۳	۷۶۱,۶۰۹,۵۹۲	۸	۳۳
۱۲	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	جهان ماندگار خیام	۱۷/۱۰۶۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۰۰	۰,۹۵۹۴	۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۳۵۵,۲۴۴	موقت ۲	۱,۲۴۴,۶۰۳,۸۸۰	۲۴	۴۷
۱۳	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۸۰	۰,۹۲۴۸	۳۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹,۶۴۹,۵۶۸	موقت ۲	۳,۵۹۱,۹۴۸,۳۶۲	۱۰۰	۷۸
۱۴	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	کوثر آب نور	۱۷/۱۰۷۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۳۰۰	۱,۰۴۶۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰,۶۰۳,۲۷۸	موقت ۳	۲,۵۳۰,۶۸۶,۱۵۷	۵۴	۷۲
۱۵	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۲۰	۱,۰۸۹۸	۱۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۷۶۵,۸۳۴	موقت ۲	۱,۲۵۴,۹۴۱,۰۴۵	۸۰	۶۵
۱۶	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۲۰	۱,۳۰۰۳	۱۴,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۱۹۲,۰۲۴	موقت ۱	-	۱۲۵	۱۲۵
۱۷	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۱۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸۰	۱,۱۰۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۷۶,۳۲۸	موقت ۱	۳,۰۸۲,۹۶۷,۱۲۸	۱۲۵	۷۸
۱۸	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۱۲۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳۰۰	۱,۱۲۰۶	۳۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۵۷,۴۱۴,۳۵۶	موقت ۵	-	۱۱۱	۱۲۱
۱۹	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۲۰۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲۰	۱,۲۹۹۳	۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۸۶۶,۷۳۵	موقت ۱	-	۱۱۸	۷۰
۲۰	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۳۷۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰	۱,۳۰۹۷	۲۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۸,۵۹۵,۹۳۶	موقت ۱	-	۹۵	۹۸
۲۱	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۳۷۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰	۱,۳	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۷۰۱,۱۹۳	موقت ۱	-	۸۱	۷۹
۲۲	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ساروج کار بستر	۱۷/۴۹۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۶۵	۱,۰۷۹۵	۲۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۴,۴۴۲,۹۵۵	موقت ۶	۷۴۰,۶۸۵,۷۸۶	۲۶	۸۲
۲۳	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۱۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶۰	۱,۱۶۶۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸,۶۵۲,۸۹۲	موقت ۱	-	۷۰	۹۹
۲۴	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۷۸۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۶۵	۱,۲	۲۰,۹۹۹,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵	۰
۲۵	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۸۲۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳۶۵	۱,۳۴۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۳۸۸,۳۰۱	موقت ۱	-	۱۰	۳۷
۲۶	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۹۴۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۶۵	۱/۲۹۸۱	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۲۷	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال و بهسازی چشمه آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۰۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۸۰	۱/۳۰۴۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۲,۶۳۶,۲۵۲	موقت ۱	-	۸۰	۶۳
۲۸	آب	خرم آباد	حصار کشی تاسیسات آب و فاضلاب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۳۲۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۴۰	۱,۳۴۶۳	۱۰۹,۰۳۸,۷۷۲,۴۵۸	-	-	-	۲	۰
۲۹	آب	خرم آباد	حصار کشی تصفیه خانه آب و نگهداری	آرمان سازه شکیل	۱۷/۳۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸۰	۱,۱۹۸۷	۶۵,۶۸۹,۸۹۰,۷۲۳	-	-	-	۰	۰
۳۰	آب	خرم آباد	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	طاق ساز	۱۷/۳۶۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰۰	۰,۹۷۷۲	۵۲۷,۷۰۶,۱۴۶,۷۰۰	-	-	-	۰	۰
۳۱	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ریشه ساز	۱۷/۳۶۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۴۰	۱,۲۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵	۰
۳۲	آب	خرم آباد	نقاط انفصال و اصلاح شبکه توزیع آب	طراحان نصر کوثر	۱۷/۴۶۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸۰	۱,۱۹۵۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۳۳	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	سیبا سازان خرم	۱۷/۴۹۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸۰	۱,۳۸	۲۸,۴۳۸,۵۱۳,۸۵۳	۱۹,۸۹۶,۳۳۲,۹۹۷	موقت ۱	-	۰	۶۷
۳۴	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۳۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۱,۰۴۸۰	۸۰,۹۶۵,۲۹۶,۴۴۰	-	-	-	۰	۰
۳۵	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۸۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸۰	۱,۴۹	۱۲۶,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۳۶	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۶۶۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۸۰	۱,۱۷۵۲	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۳۷	آب	سراب دوره	اصلاح و توسعه شبکه آب	ژرف اندیشان معماری مدرن	۱۷/۵۷۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸۰	۱,۱۸۹۸	۵۶,۱۱۱,۷۶۰,۱۶۸	-	-	-	۰	۰

شرح عملیات اجرایی:

- عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی فلک الدین و کوی آبشار (مسکن ملی)
- اجرای ۱۹۵۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب
- لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۵۱۱۰ متر
- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۴۸۱۵ متر
- نصب ۱۰۴ فقره انشعابات آب به طول ۵۷۶ متر
- احداث ۱۳ عدد حوضچه شیر آلات
- حفاری و تجهیز و نیرورسانی ۴ حلقه چاه آب در سطح شهر

ایجاد تاسیسات آب شهر خره آباد

خطوط انتقال آب

اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب شهر خره آباد



ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر خرم آباد

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش فاضلاب شهر خرم آباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	خرم آباد	تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ۵ شهر	مهرآز سامان	۱۷/۴۹۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۳۰		۲۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۰	۰
۲	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۲۳۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۸۰	۰,۸۹	۴۵,۳۰۵,۵۵۸,۴۱۱	۵۱,۹۷۳,۲۸۷,۹۸۳	موقت ۱۲	۴۲,۷۰۸,۳۱۸,۵۳۰	۱۲۲	۱۱۵
۳	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۹۴۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸۰	۰,۹۴۰۶	۴۵,۶۱۴,۱۳۷,۹۸۷	۴۴,۴۴۵,۷۷۲,۹۰۰	موقت ۸	۲۸,۰۷۹,۴۹۰,۳۵۲	۷۴	۹۸
۴	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	نگین کوشا الوند	۱۷/۱۱۱۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۰	۰,۹۱۶۷	۴۵,۹۹۳,۳۱۰,۹۵۴	۲۵,۹۰۰,۰۵۰,۴۸۱	موقت ۶	۱۱,۷۲۶,۲۰۲,۵۵۶	۷۷	۵۶
۵	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۱۲۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸۰	۰,۸۹۷۳	۴۴,۹۷۱,۹۶۹,۰۶۶	۲۳,۳۶۵,۶۴۵,۳۲۲	موقت ۲	۱۵,۰۴۱,۳۹۹,۷۸۴	۱۰۰	۵۲
۶	فاضلاب	خرم آباد	عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۳۹۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۸۰	۱,۳۰۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۹۳۷,۰۵۷	موقت ۳	-	۱۶	۱۰۱
۷	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۶۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۸۰	۱,۰۰۳۴	۲۰,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸,۳۹۲,۱۰۵	موقت ۳	۸۷۷,۵۸۶,۴۶۶	۴۰	۵۰
۸	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوه پیماسازان لرستان	۱۷/۷۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸۰	۰,۸۱۸۶	۷۱,۳۳۱,۳۱۴,۸۴۳	۱۵,۳۹۱,۴۹۷,۳۹۷	موقت ۳	-	۱۸	۲۲
۹	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۸۷۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۸۰	۱,۱۲۴۲	۳۶,۶۶۹,۱۳۰,۴۳۶	۱۸,۱۸۹,۷۰۰,۱۱۹	موقت ۲	۲,۲۸۲,۴۸۱,۹۴۰	۲۳	۵۰
۱۰	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۸۰	۱/۴۱۹۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۷	۰
۱۱	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۴۲۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱,۱۱۵۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۰	۰
۱۲	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	تحکیم سازه سپهر افلاک	۱۷/۵۰۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸۰	۱,۰۵۴۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۵	۱۶
۱۳	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۰,۸۲۲۰	۱۰۶,۸۱۷,۹۹۵,۴۳۳	-		-	۰	۰

ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر فره آباد

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی:

- لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول **۱۴۵۳ متر**
- لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول **۶۶۴۵ متر**
- احداث **۱۴۰۶** عدد دال و فوتینگ منهول های فاضلابی



ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر فره آباد



شبکه جمع آوری فاضلاب



شبکه جمع آوری فاضلاب



عملیات غرقاب



منهول فاضلابی

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

—لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۴۸۰ متر

—اجرای شبکه توزیع آب بطول ۶۲۰ متر

—نصب ۱۰۰ فقره انشعابات آب به طول ۴۵۰ متر

—احداث ۵ عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

—عملیات اجرایی ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۳ درصدی

در بخش سیویل


—لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۲۰۰ متر



ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۸۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۶۵	۰,۹۵	۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۴۴۱,۸۱۱	موقت ۵	-	۱۰	۱۴
۲	آب	پلدختر	خط انتقال آب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۹۸۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۴۰	۰,۹۸۱	۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶,۴۶۲,۰۴۰	موقت ۲	-	۱۲۵	۲۲
۳	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۹۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۰	۱/۱۲۹۷	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۴۹۸,۱۵۳	موقت ۲	-	۲۰	۱۶
۴	آب	پلدختر	احداث ساختمان پیزومتری چاه	پندار سازه توان	۱۷/۵۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۲,۲۸	۲۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۵	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۱۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۲۰	۱,۲۰۳۸	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۲۰۴,۰۹۳	موقت ۱	-	۱۰۰	۵۹
۶	آب	معمولان	خط انتقال آب	شالوده گستر افلاک	۱۷/۴۹۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸۰	۱,۴۰۵۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵	۰
۷	فاضلاب	پلدختر	شبکه جمع آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۵۲۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۸۰	۰,۹	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۶,۸۰۰,۰۰۰	موقت ۴	-	۷۹	۸۰
۸	فاضلاب	پلدختر	تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب	راه گستر گرین	۱۷/۳۰۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸۰	۱,۲۶	۳۷۹,۸۷۵,۲۴۴,۸۲۶	-	-	-	۵	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب

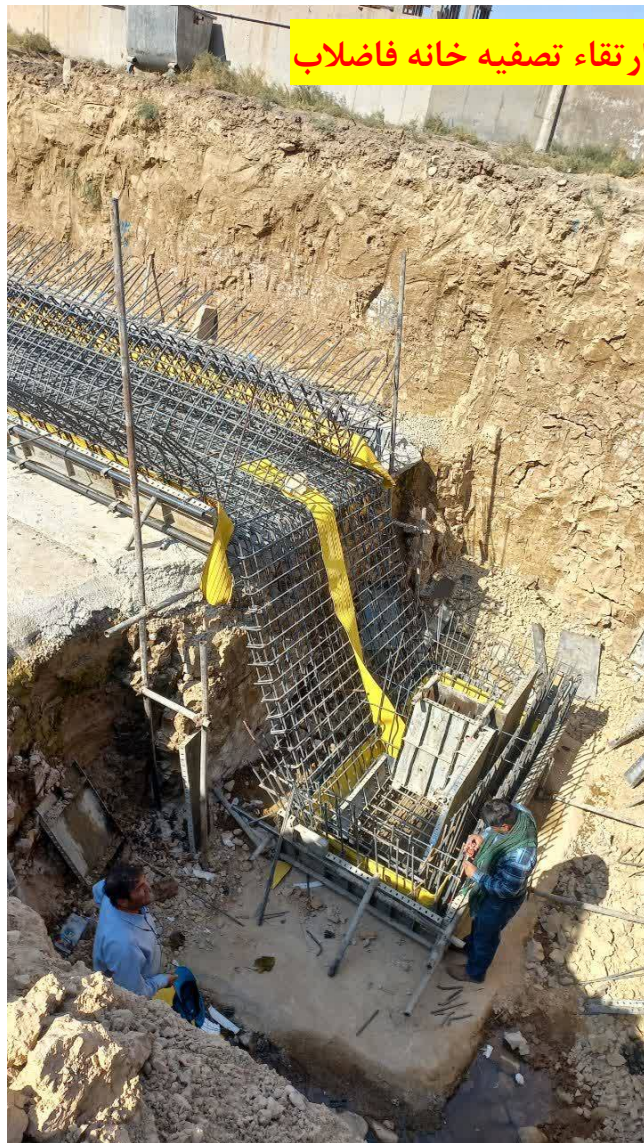

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب



خط فاضلاب زندان



خط فاضلاب زندان

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

– لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۳۰۰ متر

– اجرای شبکه توزیع آب بطول ۴۵۶۹ متر

– احداث ۷ عدد حوضچه شیر آلات


شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

– عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۹۰

درصدی در بخش سیویل

– لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۴۰۰ متر

– لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۴۵۰ متر

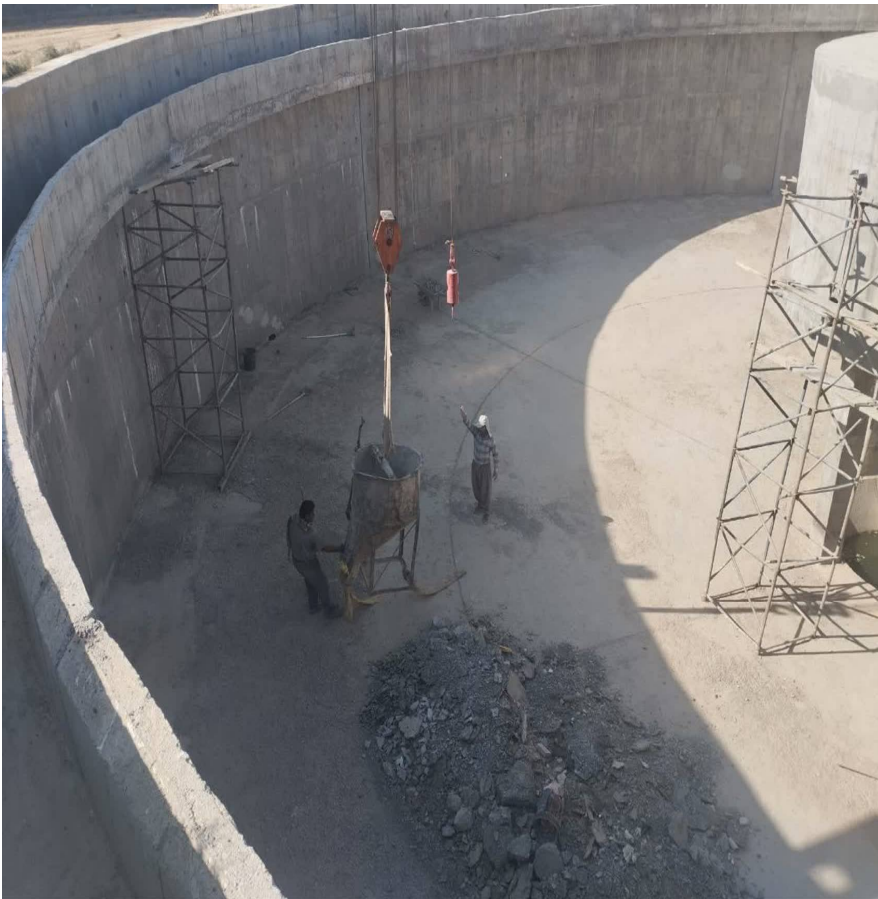

پاکسازی سازه های تصفیه خانه فاضلاب

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر کوهدشت

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران گستر غرب	۱۷/۷۸۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۶۵	۱,۶۳۵۶	۶۵,۷۰۱,۸۴۲,۰۶۴	۴۲,۰۹۲,۹۸۵,۲۴۷	موقت ۵	۸,۶۱۱,۱۹۲,۳۹۶	۱۲۵	۶۴
۲	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	پارسه سازه گرد	۱۷/۱۱۱۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰۰	۱,۴۴۵	۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۵۴,۶۶۳	موقت ۱	-	۲۷	۵
۳	آب	کوهدشت	نیروورسانی	پویا الکتریک باختر	۱۷/۳۲۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۰	۱,۲۰۸۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۳۳۶,۹۰۴	موقت ۱	-	۱۰۰	۷۱
۴	آب	کوهدشت	نیروورسانی	پویا الکتریک باختر	۱۷/۳۲۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۰	۱,۴۸	۱۸,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۶۶۴,۸۵۷	موقت ۱	-	۹۰	۱۹
۵	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران خاک کوهدشت	۱۷/۳۶۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۱,۰۹۷	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۵۳	۰
۶	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱,۲۳۹۳	۶۰,۸۴۲,۷۳۲,۴۰۳	۳۶,۱۸۷,۸۷۷,۶۱۱	موقت ۹	۱۳,۶۹۸,۱۸۲,۲۷۵	۶۹	۵۹
۷	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱,۱۶۹۶	۵۸,۴۴۷,۶۰۴,۱۴۴	۲۸,۰۱۱,۷۲۵,۴۹۰	موقت ۸	۱۳,۴۹۹,۵۵۱,۹۱۳	۲۸	۴۸

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت



تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول ۱۱۵۰ متر

— نصب ۳۰ فقره انشعابات آب به طول ۲۵۰ متر

— احداث ۲ عدد حوضچه شیر آلات



شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی

در بخش سیویل

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر نورآباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۸۴۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۶۵	۱,۶۶	۷۳,۳۲۳,۳۰۶,۶۸۸	۲۱,۸۲۲,۷۹۵,۶۹۰	موقت ۲	۱۷,۳۹۱,۲۱۲,۶۶۸	۴۸	۳۰
۲	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۱۰۵۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۰	۱,۵۰۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۳۹	۰
۳	فاضل اب	نورآباد	تصفیه خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۱۰۱۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۷۳۰	۱,۸۲۷۲	۷۰۸,۴۰۷,۴۱۰,۱۳۸	۵۴۶,۷۲۱,۰۳۴,۷۹۴	موقت ۲۰	۳۴۳,۶۷۴,۴۷۱,۹۱۹	۷۹	۷۷
۴	فاضل اب	نورآباد	شبکه جمع آوری فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۵۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۸۰	۰,۸۹۲۸	۱۸۴,۹۸۷,۷۱۱,۹۹۲	-		-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد



تصفیه خانه فاضلاب



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۱۴۷۲** متر

— احداث **۲** عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با

پیشرفت فیزیکی **۴۵** درصدی در بخش سیویل



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر


پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر الشتر

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	فرداد بنا لرستان	۱۷/۸۷۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۶۵	۱,۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۱۲	۰
۲	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	نیک اسکان خاوران	۱۷/۳۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۲۰	۱/۳۵۲۹	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۱۲۵	۰
۳	فاضلاب	الشتر	تصفیه‌خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم‌آباد	۱۷/۱۲۴۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۶۵	۱,۶۱۸۷	۸۰۶,۱۷۶,۰۰۸,۵۵۲	۱۵۴,۲۲۱,۷۱۱,۰۳۱	موقت ۴	۵۷,۷۴۷,۵۴۸,۴۸۹	۴۸	۱۹

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر



تصفیه خانه فاضلاب

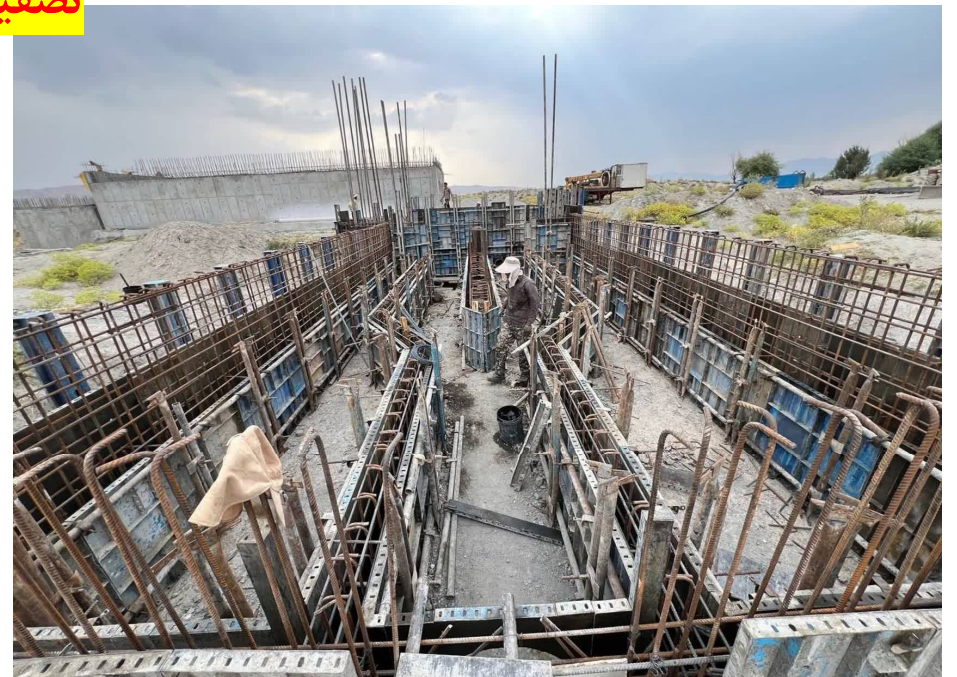

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:



شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

– عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی

۳۰ درصدی در بخش سیویل

– عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب با پیشرفت فیزیکی

۶۰ درصدی در بخش سیویل

– لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۴۰ متر

– لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۲۴۲۰ متر

عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر دورود

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	دورود	تامین آب شرب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۲۰	۱,۲۸۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۸۵۶,۹۹۴	موقت ۲	۱,۸۶۸,۶۸۷,۱۳۴	۳۵	۶۸
۲	آب	دورود	احداث و تجهیز چاه آب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۸۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۲۰	۱,۱۹۹۳	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۹,۳۲۳,۶۸۱	موقت ۲	۲۴۱,۵۶۴,۱۶۶	۱۸	۶۲
۳	آب	دورود	حصارکشی	مقاوم سازان آرات	۱۷/۷۶۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۶۵	۱,۱۶۵۱	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۹۶۶,۵۳۲	موقت ۲	-	۲۰	۶۷
۴	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	نگین شهر آرتین	۱۷/۵۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۶۵	۱,۰۴۲۲	۲۰,۷۳۹,۷۷۹,۹۹۶	۷,۸۴۴,۷۵۶,۳۲۶	موقت ۱	-	۳۴	۳۸
۵	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	شالوده گستر دورود	۱۷/۱۱۳۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳۰۰	۱,۴۷۹۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱	۰
۶	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم آباد	۱۷/۵۶۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸۰	۱,۱۳۷۴	۲۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۷	آب	دورود	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱,۳۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۸	فاضلاب	دورود	تصفیه خانه فاضلاب	ساز آب کیان پاد	۱۷/۶۷۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱۰	۱,۱۹۴۸	۵۶۱,۵۳۶,۰۶۵,۵۷۱	۱۳۰,۸۸۴,۶۲۷,۶۸۶	موقت ۳۰	۴۳۹,۴۷۶,۲۸۵,۲۵۷	۲۶	۲۳
۹	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۲۹۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸۰	۰,۹۱۹۲	۵۰۰,۸۳,۱۹۷,۹۶۵	۴۵,۶۸۵,۴۲۳,۳۲۰	موقت ۳	-	۱۱۸	۹۱
۱۰	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	بهینه سازه متین	۱۷/۳۴۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸۰	۱,۲۷۸	۷۳,۸۹۲,۳۴۸,۲۹۶	۴۷,۰۲۲,۴۰۸,۱۶۷	موقت ۵	-	۱۲۵	۶۴
۱۱	فاضلاب	دورود	ایستگاه پمپاژ PS۲	ویرا تدبیر آرکان	۱۷/۹۴۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸۰	۱,۶۰۵۲	۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۳,۴۳۶,۴۵۹	موقت ۴	-	۱۲	۲۰
۱۲	فاضلاب	دورود	ترمیم و مرمت نوار حفاری و آسفالت	صالح طرح کارا	۱۷/۱۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۳۰	۱,۶	۹,۹۸۴,۶۳۰,۲۸۸	۶,۷۰۷,۸۶۹,۹۲۸	موقت ۱	-	۷۰	۸۶
۱۳	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۴۶۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۸۰	۱,۱۰۳	۲۰,۴۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۳,۸۴۸,۳۴۹,۲۲۷	موقت ۳	۱,۳۷۰,۶۷۳,۸۵۵	۵۰	۶۷
۱۴	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۶۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۸۰	۱,۳۲۴۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳	۰
۱۵	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۴۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱,۱۰۷۶	۱۸۹,۹۷۷,۲۱۱,۲۱۴	-	-	-	۱۱	۰
۱۶	فاضلاب	دورود	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	بابک ساروج لرستان	۱۷/۶۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۸۰	۱,۱۴۵	۱۲۹,۸۲۵,۸۵۱,۲۵۵	-	-	-	۰	۰
۱۷	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱,۱۰۰۴	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود



تصفیه خانه فاضلاب




ایستگاه پمپاژ فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود



شبکه فاضلاب و مرمت نوار حفاری

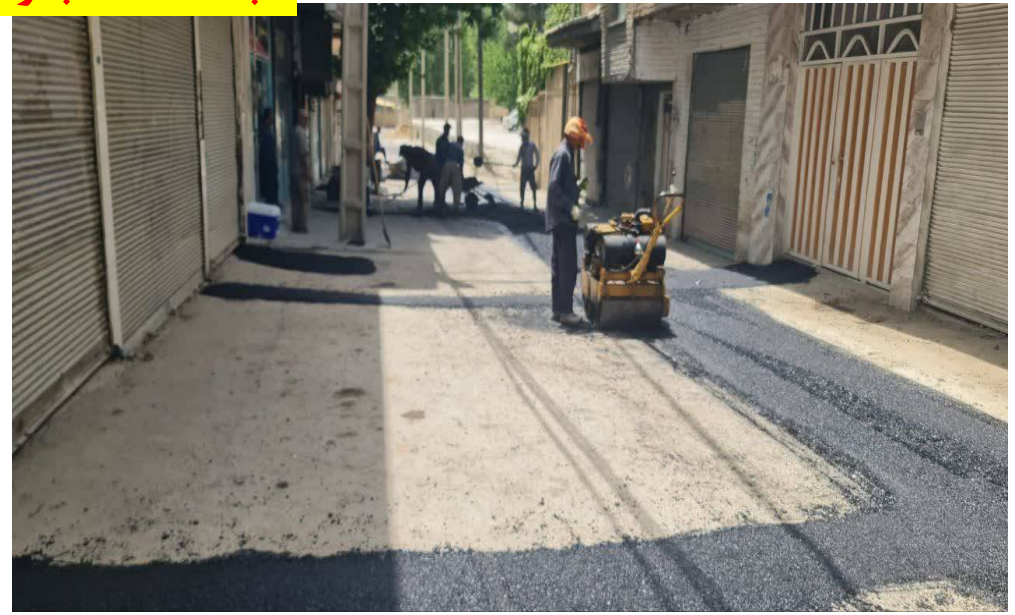

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۱۹۰۰ متر**

— نصب **۱۰** فقره انشعابات آب به طول **۴۰ متر**

— احداث **۲** عدد حوضچه شیر آلات



شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با

پیشرفت فیزیکی **۸۰ درصدی** در بخش سیویل

عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر ازنا

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	ازنا	نصب پکیج تصفیه آب	برین پالاد	۱۷/۹۳۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۰	۱,۱۰۸۱	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۷۳۶,۰۰۰	موقت ۲	-	۱۰۰	۶۹
۲	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۳۸۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۴۰	۱,۴۸۶۳	۵۰,۶۲۶,۲۹۰,۷۶۹	۵۲,۱۸۷,۳۸۰,۹۸۸	موقت ۸	-	۵۹	۱۰۳
۳	آب	ازنا	تکمیل نصب و راه‌اندازی پکیج تصفیه آب	رامان بنای تدبیر	۱۷/۹۷۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۲۰	۱,۶۶۶۱	۳۲,۸۲۲,۸۰۰,۷۵۳	۱۷,۵۱۵,۷۱۴,۱۱۹	موقت ۲	-	۵۰	۵۳
۴	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	نیکنام ازنا گستر	۱۷/۶۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۶۵	۱,۱۳۵۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۵۴	۰
۵	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	پویا رهرو تابش	۱۷/۵۱۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۶۵	۱,۱۲	۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۲۹۶,۶۳۰	موقت ۱	-	۵۵	۷۳
۶	آب	ازنا	ساخت، بازسازی و مرئی سازی حوضچه‌های آب	پویا رهرو تابش	۱۷/۵۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۴۰	۱,۵۲	۴,۹۸۸,۱۲۳,۱۵۵	-		-	۲۰	۰
۷	آب	ازنا	ایستگاه پمپاژ آب کمندان	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۶۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰	۱,۴۹۸۳	۲۸,۴۶۶,۶۶۶,۶۷۷	-		-	۰	۰
۸	آب	ازنا	خط انتقال ایستگاه پمپاژ اضطراری	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۹۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲۰	۱,۵۲۷۲	۲۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-		-	۰	۰
۹	فاضلاب	ازنا	تصفیه‌خانه فاضلاب	توسعه گستران سپاهان	۱۷/۱۱۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۶۵	۱,۸۴۴۸	۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۷	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا



تصفیه خانه فاضلاب



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی

— اجرای ۶۵۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۶۵۵۰ متر



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر الیگودرز

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	الیگودرز	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	راه گسترگرین	۱۷/۴۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۶۵	۱,۳۹	۱۶۵,۵۰۸,۶۱۷,۴۲۸	۸۸,۷۶۴,۸۷۹,۲۷۵	موقت ۵	-	۷۰	۵۳
۲	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	کاسیت راه افلاک	۱۷/۸۰۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳۶۵	۱,۰۸	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۷	-	-	-	۰	۰
۳	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	سپید صنعت پیشرو بیدستان	۱۷/۱۰۳۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰۰	۱,۹۸	۷,۸۱۳,۰۴۷,۴۸۸	-	-	-	۴	۰
۴	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۱۱۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۶۵	۱/۳۹۹۹	۲۰,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۵	فاضلاب	الیگودرز	ترمیم و مرمت نوار حفاری و آسفالت	زیبا سازان پایدار اراک	۱۷/۹۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۶۰	۱,۴۹۹۶	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۸۶,۸۰۸	موقت ۱	-	۴۵	۳۳
۶	فاضلاب	الیگودرز	شبکه فاضلاب و ساختمان تصفیه خانه	راهان دژ غدیر پارس	۱۷/۱۳۴۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳۶۵	۰,۹۷۵۸	۴۲,۸۹۵,۰۱۳,۳۴۹	۱۷,۸۵۱,۳۳۸,۸۷۴	موقت ۸	-	۱۲۰	۴۲
۷	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۶۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۵	۰,۷۹۴۷	۴۰,۳۹۲,۴۶۵,۰۱۵	۱۶,۱۷۷,۵۸۱,۹۱۵	موقت ۳	-	۵۹	۴۰
۸	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۶۰۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۳۶۵	۰,۸۲	۴۱,۶۲۶,۰۲۴,۴۶۰	۲۶,۵۶۳,۲۱۷,۶۸۲	موقت ۹	-	۶۶	۶۴
۹	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع آوری فاضلاب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۶۸۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۸۰	۱,۰۶	۷۰,۷۲۳,۴۴۹,۵۸۸	۲۵,۱۳۱,۱۲۸,۲۸۲	موقت ۵	-	۸۷	۳۵
۱۰	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۳۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸۰	۰,۹۱۵	۸۱,۰۷۶,۶۴۰,۱۷۷	۱۱,۷۵۶,۱۱۲,۸۲۶	موقت ۱	-	۷۴	۱۵
۱۱	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع آوری فاضلاب	کوشش سازه لرستان	۱۷/۳۶۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۰,۹۱۹۰	۲۳۷,۵۰۵,۵۱۲,۶۵۲	-	-	-	۴	۰
۱۲	فاضلاب	الیگودرز	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۹۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۰	۱,۱۵۱۹	۱۳۲,۹۶۳,۶۹۵,۲۹۰	-	-	-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

عنوان طرح :



مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی



شبکه جمع آوری فاضلاب



خدا ما خان کن سرانجام کار
تو خوشو دباشی و مار سگار

